



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 221

DEL 14 Luglio 2025

<b>OGGETTO:</b> Gara di appalto per l'allestimento di Casa Italia Milano Cortina 2026 a Milano, Cortina, Livigno.  Importo massimo Gara € 1.550.015,18 (unmilione cinquantocinquantamilaquindicieuro//18)									
	INVIATA PER L'ESECUZIONE A : <table border="1"><tr><td>MKT</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> TRASMessa PER CONOSCENZA A : <table border="1"><tr><td>A</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> IL	MKT				A			
MKT									
A									

LA GIUNTA NAZIONALE

**VISTO** l'articolo 7 del Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** l'articolo 7 dello Statuto dell'Ente, nella sua versione attualmente in vigore, modificato dal Consiglio Nazionale il 23 febbraio 2021 con deliberazione n. 1684, approvato con DPCM del 8 febbraio 2022;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, nella sua versione attualmente in vigore, così come approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 1443 del 7 giugno 2011 e dalle Autorità vigilanti in data 6 ottobre 2011, con lettera n. 5479;

**TENUTO CONTO** del Bilancio di Previsione 2025 proposto dalla Giunta Nazionale del CONI e approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 16 Dicembre 2024;

**VISTI** l'art. 12 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e ss.mm.ii. e l'articolo 9 dello Statuto del CONI, che delineano le funzioni del Segretario Generale dell'Ente;

**CONSIDERATO** il Decreto Legge n. 5 del 29 gennaio 2021 "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)" che ha sancito l'autonomia funzionale del CONI.

**CONSIDERATI** i compiti posti in capo al Segretario Generale dell'Ente dallo Statuto

**CONSIDERATO** che con delibera n. 62 del 14 marzo 2025 si dava mandato al Segretario Generale di sottoscrivere i contratti CASA ITALIA Milano Cortina 2026 per le tre case previste dal progetto di Milano, Cortina e Livigno;

**CONSIDERATO** che il CONI, per l'organizzazione di Casa Italia ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, necessita del supporto di professionisti esterni all'Ente, così come già fatto nelle precedenti edizioni dei Giochi Olimpici, oltre che di fornitori di beni e servizi e che le attività propedeutiche alla realizzazione di Casa Italia Milano Cortina 2026 sono iniziate con la stesura di un concept a cui è seguita durante il 2025 una fase di approfondimento progettuale e di realizzazione degli esecutivi e dei disegni tecnici oltre alla stesura del capitolato dei lavori da effettuare, necessario per indire una gara di allestimento per la realizzazione di Casa Italia Milano Cortina 2026;

**VISTO** il Memorandum of Understanding sottoscritto il 9 giugno 2020 tra CONI e la Fondazione Milano Cortina 2026 e approvato dal CIO in data 19 giugno 2020 in materia di Casa Italia e dei servizi di ospitalità che si svolgeranno all'interno della casa ospitalità della delegazione italiana durante i Giochi Olimpici che il CONI dovrà assicurare agli Sponsor del CIO e della Fondazione Milano Cortina 2026;

**VISTO** lo specifico Memorandum of Understanding sottoscritto il 10 giugno 2025 tra CONI e la Fondazione Milano Cortina 2026 relativamente allo sfruttamento commerciale, alla gestione dei Partner a Casa Italia Milano Cortina 2026 e ai relativi servizi da erogare così da alimentare il finanziamento economico del progetto attraverso risorse esterne;

**TENUTO CONTO** che fino alle precedenti Olimpiadi di Pechino 2022 la società Sport e Salute Spa forniva i servizi per la progettazione e la gestione di Casa Italia alle Olimpiadi per conto e nome del CONI;

**PRESO ATTO** che tale attività si è avviata già con effetti sull'esercizio 2023, 2024 e nell'anno 2025 e viene gestita direttamente dalla Direzione Marketing del CONI, avvalendosi di un supporto esterno da parte di qualificati professionisti e di società esterne all'Ente;

**PRESO ATTO** delle attività propedeutiche alla realizzazione di Casa Italia e alle attività di marketing da predisporre per i partner del programma TOP XI del CIO e per i partner domestici di Milano Cortina 2026, e che tali attività di progettazione, produzione e gestione di Casa Italia, graveranno sulla Direzione Marketing del CONI;

**RITENUTO** necessario assicurare la piena realizzazione della attività di cui al Progetto Casa Italia, al fine di favorire il successo del Progetto stesso, che rappresenta uno degli obiettivi primari dell'Ente;

**VALUTATA** la necessaria copertura finanziaria delle spese già ricomprese nel budget previsionale 2025 e alle risorse che saranno a copertura delle attività di marketing nel 2026;

**TENUTO CONTO** che in mancanza dei ricavi provenienti dalla contribuzione del programma TOP XI degli sponsor del CIO nel quadriennio 2025-2028 il progetto Casa Italia dovrà sviluppare ricavi aggiuntivi dalle attività commerciali legate allo sfruttamento degli asset del CONI e parimente diminuire i costi complessivi del progetto Casa Italia rispetto alle edizioni precedenti così da mantenere la sostenibilità economica e assicurare il finanziamento economico del progetto attraverso ricavi provenienti unicamente da privati;

**TENUTO CONTO** delle esigenze e il carattere di urgenza per definire tutte le attività preparatorie all'esecuzione di Casa Italia Milano Cortina 2026 e alle necessità allestitivo che per l'Olimpiade Invernale è necessario programmare ed effettuare con largo anticipo per motivi climatici;

**CONSIDERATO** il programma di marketing congiunto tra l'Ente CONI, di notevole rilevanza non solo per l'Ente CONI ma per gli stakeholder e i Partner del movimento Olimpico e fondamentale anche per la promozione del sistema Paese come Paese ospitante delle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026, e la Fondazione Milano Cortina 2026 che prevede iniziative da programmare insieme per lo sfruttamento commerciale congiunto degli asset Casa Italia e Italia Team;

**VISTA** la scelta effettuata dalle funzioni apicali dell'Ente CONI rispetto alla NOTA presentata in Giunta Nazionale in data 22 Gennaio 2025 e successivamente con delibera n.62 del 14 marzo 2025, si è deciso di procedere con una CASA ITALIA diffusa su tre diverse location rispettivamente a Milano, Cortina e Livigno e che le tre location scelte, tutte insieme, hanno un rapporto ottimale tra spazi, costi, posizione e servizi integrati di ospitalità in linea con le valorizzazioni economiche delle precedenti case ospitalità del CONI;

**PRESO ATTO** di quanto indicato nella nota allegata relativamente al computo e al relativo capitolato con la divisione e la stima dei costi delle varie voci relativamente all'allestimento degli spazi nei tre diversi siti come sopra riportati, necessaria per dare seguito alle attività necessarie alla realizzazione di Casa Italia;

**VISTO** quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "D.Lgs. 50/2016");

tutto ciò premesso ritenuto e considerato

#### DELIBERA

- di autorizzare l'impegno di spesa pari a complessivi € 1.550.015,18 (Euro unmilionececinquecentocinquantamilaquini/18
- di dare mandato al dott. Carlo Leonardo Mornati, quale Segretario Generale dell'Ente e Capo Missione ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, a predisporre tutti gli atti relativi alla procedura per l'affidamento attraverso gara pubblica di servizi di "Allestimento Casa Italia Milano Cortina 2026" e compiere tutti gli atti successivi e consequenziali per il corretto espletamento delle procedure di legge necessarie secondo quanto previsto dal codice degli appalti.


La liquidazione delle somme dovute graverà sul conto B.7.b.3.6 per altri costi per servizi resi da terzi del bilancio di previsione 2025 e 2026 del CONI sulla base dell'approvazione del provvedimento da parte del Consiglio Nazionale.


**IL SEGRETARIO**  
F.to Carlo Mornati

**IL VICE PRESIDENTE**  
F.to DIANA BIANCHEAI

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa

Il Responsabile Marketing  
Lorenzo Pellicelli



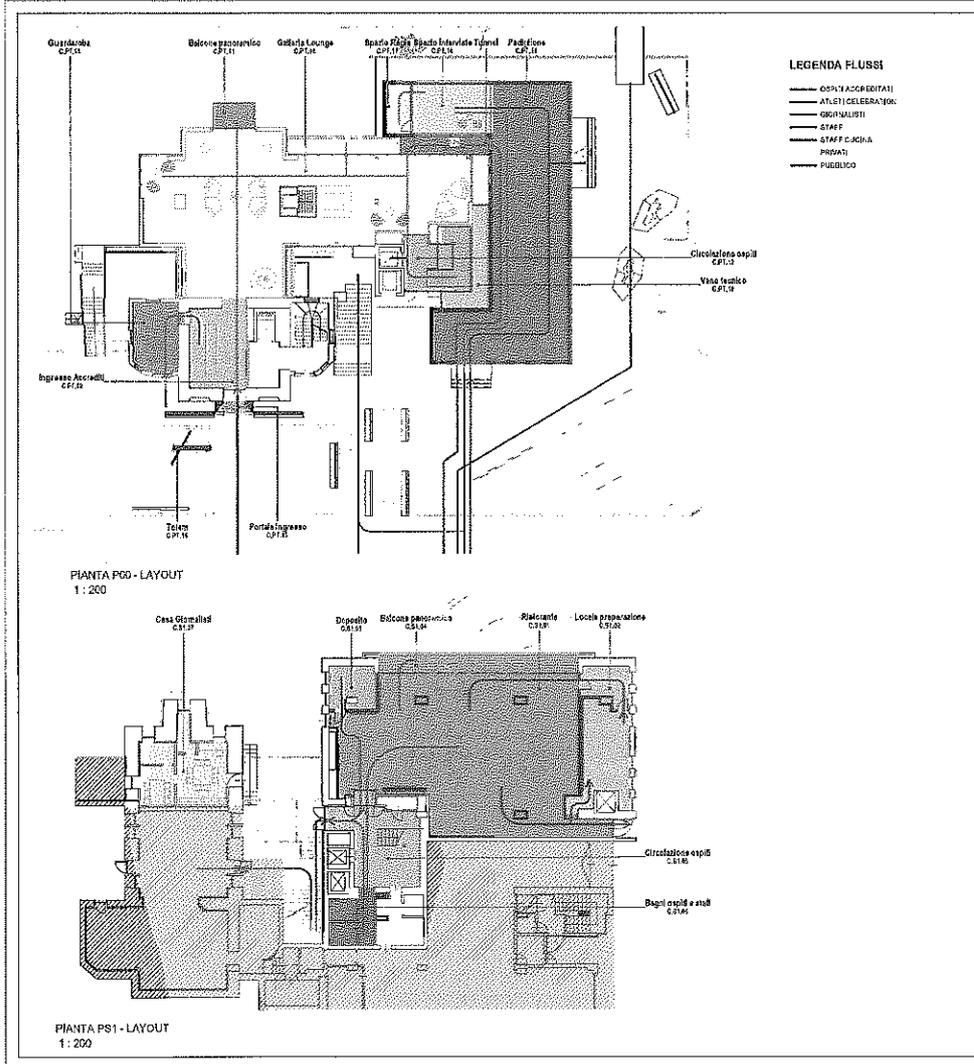

**NOTE GENERALI:**

- Tutte le misure indicate devono essere verificate da sito prima della realizzazione.
- In caso di discrepanza tra gli elaborati progettuali, prevalgono quelli annotati con la data maggiore e con livello di dettaglio superiore.
- Nei particolari elaborati, il progettista si è ispirato agli schemi e modelli elaborati con i codici EDI (anno Programmario, Titolo) e ha tenuto conto delle norme e delle indicazioni, al fine di conformarsi alle prescrizioni. La fornitura e la posa dei dispositivi suddetti non sono comprese nell'appalto.
- L'ingegnere è il progettista delle opere d'arte ingegneristica con il codice SPA. Il lavoro Progettativo non è limitato come indicazione generale e deve essere verificato in sito. La fornitura delle opere non è inclusa nell'appalto.
- Le indicazioni relative al dimensionamento degli apparecchi idraulici presentati in questa elaborazione hanno valore puramente indicativo. Per la progettazione e realizzazione dell'impianto idraulico sono da farsi riferimento agli elaborati specifici. Tutte le installazioni dovranno essere conformi ai requisiti minimi vigenti.
- Le indicazioni relative alla posizione dei gruppi di elettrodomestici sono da considerarsi indicative. Per misure, quantità e il prezzo devono essere verificati in sito, dove diverse indicazioni, non è possibile in realtà, essere o comunque adeguatamente indicati in modo da essere conformi alle norme vigenti.

---

**ALLESTIMENTO CASA ITALIA "MUSA" - Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026**  
 Farenzola Cortina  
 Piazza Roma, 10 - 32043 Cortina d'Ampezzo (BL)

**COMITENTE:**


**EDIFICAZIONE:**

<b>PROGETTAZIONE ARCHITETTURA:</b> 	<b>PROGETTAZIONE SERVIZI:</b> 	<b>GRAFICA:</b> 	<b>GRAFICA ARTISTICA:</b> 	<b>PROGETTAZIONE FLUIDO-TECNICA:</b> 
<b>PROGETTAZIONE IMPIANTI:</b> 	<b>PROGETTAZIONE ALTERNATIVE:</b> 			

**NOME PROGETTO:**  
148 Casa Italia "Musa" - Cortina

<b>FASE PROGETTUALE:</b> PROGETTO ESECUTIVO	<b>DATA:</b> 30/06/2025
<b>PROGETTISTA:</b> ITS	<b>SCALA:</b> 1:200
<b>TITOLO DOCUMENTO:</b> PIANTE - LAYOUT	<b>GIORNATA:</b>

CC	REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REVISIONE
148C	PE	ARC	301	PNT

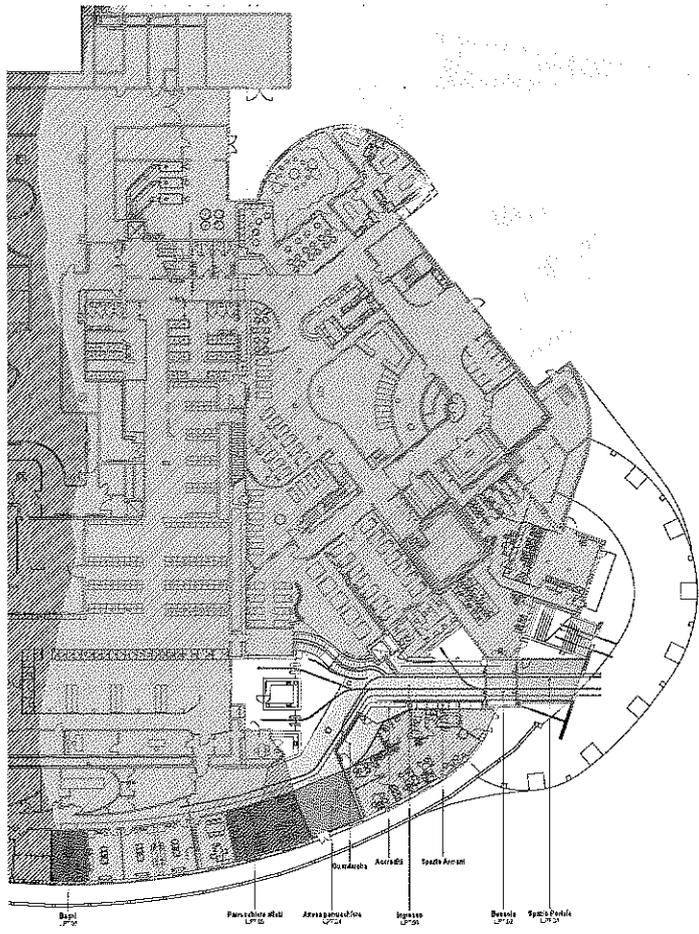

PIANTA PT - LAYOUT  
1/200

**LEGENDA FLUSSI**

- ACCESSO PUBBLICO AMPLIAMENTO
- ACCESSO OSPRI/ACCELERATI
- ACCESSO ATLETI/DELEGATI
- ACCESSO PUBBLICO
- ACCESSO ATLETI/SERVIZI
- ACCESSO STAFF
- ACCESSO ORGANIZZATI
- ACCESSO PUBBLICO

LAYOUT FUNZIONI	
ANIME STRADA	CODICE STRADA
Accademia	
Accademia Calc. Area	LP1.07
Accademia	LP1.08
Accademia Calc. Area	LP1.09
Accademia Calc. Area	LP1.10
Accademia Calc. Area	LP1.11
Accademia Calc. Area	LP1.12
Accademia Calc. Area	LP1.13
Accademia Calc. Area	LP1.14
Accademia Calc. Area	LP1.15
Accademia Calc. Area	LP1.16
Accademia Calc. Area	LP1.17
Accademia Calc. Area	LP1.18
Accademia Calc. Area	LP1.19
Accademia Calc. Area	LP1.20
Accademia Calc. Area	LP1.21
Accademia Calc. Area	LP1.22
Accademia Calc. Area	LP1.23
Accademia Calc. Area	LP1.24
Accademia Calc. Area	LP1.25
Accademia Calc. Area	LP1.26
Accademia Calc. Area	LP1.27
Accademia Calc. Area	LP1.28
Accademia Calc. Area	LP1.29
Accademia Calc. Area	LP1.30
Accademia Calc. Area	LP1.31
Accademia Calc. Area	LP1.32
Accademia Calc. Area	LP1.33
Accademia Calc. Area	LP1.34
Accademia Calc. Area	LP1.35
Accademia Calc. Area	LP1.36
Accademia Calc. Area	LP1.37
Accademia Calc. Area	LP1.38
Accademia Calc. Area	LP1.39
Accademia Calc. Area	LP1.40
Accademia Calc. Area	LP1.41
Accademia Calc. Area	LP1.42
Accademia Calc. Area	LP1.43
Accademia Calc. Area	LP1.44
Accademia Calc. Area	LP1.45
Accademia Calc. Area	LP1.46

- NOTE OBBLIG.**
1. Verificare l'esecuzione delle opere in tutti i punti di riferimento di cantiere.
  2. In caso di variazioni rispetto al progetto, le variazioni dovranno essere approvate dal committente e dal progettista.
  3. Il presente progetto è di natura preliminare e non costituisce un contratto. Il committente si riserva il diritto di modificare o annullare il presente progetto in qualsiasi momento.
  4. Il presente progetto è di natura preliminare e non costituisce un contratto. Il committente si riserva il diritto di modificare o annullare il presente progetto in qualsiasi momento.
  5. Il presente progetto è di natura preliminare e non costituisce un contratto. Il committente si riserva il diritto di modificare o annullare il presente progetto in qualsiasi momento.
  6. Il presente progetto è di natura preliminare e non costituisce un contratto. Il committente si riserva il diritto di modificare o annullare il presente progetto in qualsiasi momento.

**ALLESTIMENTO CASA ITALIA "MUSA" - Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026**

PROGETTO: **it's**

COORDINAMENTO: **it's**

CONTRATTI: **CONI**, **CONI**, **CONI**

<b>it's</b>	<b>HERO</b>	<b>CONI</b>	<b>CONI</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

PROGETTO: **101 Casa Italia "Musa" - Livigno**

PROGETTO ESECUTIVO: **IT'S**

PROGETTO: **IT'S**

DATA: **1.2023**

NO.	DESCRIZIONE	DATA	STATO
1	PROGETTO ESECUTIVO	1.2023	IN CORSO

1481	PE	ARO	251	ENT	POO	00
------	----	-----	-----	-----	-----	----









OLYMPIC WINTER GAMES 2026

Rev. 0.0 - 03.07.2025

CASA ITALIA - Milano-Cortina ITALY  
Milano - Cortina - Livigno  
Works date:  
EVENT date:

anno	plano	area	codice	prog	settore lavorazione	descrizione	unità di misura	quantità	altro dimensionale	prezzo unitario	totale	Subtotale	codice tavola di riferimento	tariffa
M	PT 24	esterno		091		struttura	?	incollaggio	a corpo	1,00				
M	PT 26	esterno		092		ristrutturazione	?	foratura	mq	64,00				
M	PI 10	interno	SCH01	033		struttura in legno		incollaggio	a corpo	1,00				
M	PT 10	esterno	SCH01	034		calce struttura zone a vista		foratura	mq	94,00				
M	PT 10	esterno	MUR02	035		pannelli		foratura	mq	18,00				
M	PI 22	interno	SF001	036		verete madaglia		foratura	mq	28,00				
M	PI 06	esterno	MUR01	037		verete sotto finestra	GRANCO	foratura	mq	77,00				
M	PI 06	esterno	MUR04	038		verete verso altro	TESSUTO PIUSSETTATO TRASPARENTE	foratura	mq	102,95				
M	PI 06	esterno	PAW01	039		investimento parete verso occhio in tessuto	NESSUTO PIUSSETTATO TRASPARENTE	foratura	mq	95,00				
M	PI 06	esterno	QON01	040		velate	TESSUTO PIUSSETTATO TRASPARENTE	foratura	mq	522,90				
M	PI 06	esterno	SF001	041		consigliata	GRANCO	foratura	mq	21,26				
M	PI 06	esterno	PAW01	042		copertura	TAPPEO BORDATO SUDGOMATO POLIURETANICO 1° e 2° SASSO TINTA UNITA	foratura	mq	76,90				
M	PI 03	interno	SF02	043		placca	foratura	mq	70,00					
M	PI 03	interno	SF02	044		placca	foratura	mq	1,00					
M	PI 20	interno	MUR03	045		verete	foratura	mq	43,00					
M	PI 20	interno	SF02	046		verete	foratura	mq	76,00					
M	PI 01	interno	PAW01	047		verete	TINTA UNITA	foratura	mq	130,00				
M	PI 01	interno	SCH03	048		verete	TORN CON MOQUETTE (senza Biscia)	foratura	mq	2,00				
M	PI 01	interno	QON02	049		verete	foratura	mq	125,00					
M	PI 01	esterno		020		pedana	foratura	mq	85,00					
M	PI 01	esterno		021		pannelli fang. occhio	foratura	mq	96,00					
M	PI 01	esterno		022		velate	foratura	mq	86,00					
M	PI 01	esterno		023		frangine e stoppaggio anodi a coraggente ipostaticamente	manodopera	a corpo	1,00					
M	PI 03	esterno		024		verete per mascheramento luci Galleria Esterna	foratura	mq	85,63					
M	PI 05	esterno		025		verete per mascheramento luci terrazza panoramica	foratura	mq	65,69					
M	PI 05	esterno		026		verete per mascheramento luci terrazza panoramica	foratura	mq	120,63					
M	PI 05	esterno		027		verete per mascheramento luci terrazza panoramica	foratura	mq	1,00					
M	PI 05	esterno		028		montaggio moquette	manodopera	a corpo	200,69					
M	PI 05	esterno		029		trasporto	manodopera	a corpo	1,00					
M	PI 05	esterno		030		trasporto	foratura	a corpo	2,00					
M	PI 05	esterno		031		montaggio Anca	manodopera	a corpo	1,00					
M	PI 05	esterno		032		smontaggio / assemblaggio	manodopera	a corpo	1,00					
M	PI 05	esterno		033		verete	foratura	a corpo	1,00					
M	PI 05	esterno		034		verete	foratura	a corpo	1,00					
M	PI 05	esterno		035		verete	manodopera	a corpo	1,00					
M	PI 05	esterno		036		verete	foratura	a corpo	1,00					
M	PI 05	esterno		037		verete	manodopera	a corpo	1,00					
L	PI 17	esterno		091		struttura		incollaggio	a corpo	1,00				
L	PI 17	esterno		092		ristrutturazione		foratura	mq	44,40				
L	PI 01	esterno	MUR02	053		struttura		incollaggio	a corpo	1,00				
L	PI 01	esterno	MUR02	054		struttura	ALLUMINIO	foratura	mq	144,90				
L	PI 01	esterno	SF001	055		struttura	ALLUMINIO	foratura	mq	74,90				
L	PI 01	esterno		056		struttura		foratura	mq	33,00				
L	PI 02	esterno	SF004	057		struttura		foratura	mq	18,90				
L	PI 02	esterno	SF004	058		struttura		foratura	mq	6,00				
L	PI 03	interno	PAW01	059		struttura		foratura	mq	176,90				
L	PI 03	interno	PAW01	060		struttura	TINTA UNITA LATO BORDATO	foratura	mq	176,90				
L	PI 03	interno	LED03	061		struttura	LED	foratura	mq	21,00				
L	PI 03	interno	FIR04	062		struttura	ALLUMINIO	foratura	mq	4,00				
L	PI 03	interno	MUR01	063		struttura	ALLUMINIO	foratura	mq	46,00				
L	PI 03	interno	FIR04	064		struttura	foratura	mq	60,00					
L	PI 03	interno	AN001	065		struttura	FAFARTE DELLA PARETE/ALLUMINIO	foratura	a corpo	1,00				
L	PI 03	interno	MUR01	066		struttura	APRIBILI FRONTALMENTE	foratura	a corpo	4,00				
L	PI 03	interno		067		struttura	foratura	mq	11,00					
L	PI 03	interno		068		struttura	foratura	mq	205,00					
L	PI 03	interno		069		struttura	foratura	a corpo	1,00					
L	PI 07	esterno	PAW08	070		struttura	MOQUETTE	foratura	a corpo	1,00				
L	PI 07	esterno		071		struttura	foratura	a corpo	1,00					
L	PI 04	esterno	PAW02	072		struttura	foratura	mq	35,69					
L	PI 04	esterno	PAW02	073		struttura	MOQUETTE	foratura	mq	35,69				
L	PI 04	esterno	FIR02	074		struttura	ALLUMINIO	foratura	mq	32,00				
L	PI 06	esterno	PAW03	075		struttura	MOQUETTE	foratura	mq	136,69				
L	PI 06	esterno	FIR01	076		struttura	foratura	a corpo	1,00					
L	PI 06	esterno	FIR01	077		struttura	BANCO DA CAPIRE QUESTIONE EREDITA	foratura	mq	152,00				
L	PI 06	esterno		078		struttura	foratura	a corpo	1,00					
L	PI 06	esterno		079		struttura	foratura	mq	39,00					
L	PI 06	esterno		080		struttura	foratura	mq	29,00					
L	PI 06	esterno		081		struttura	foratura	mq	205,90					
L	PI 10	interno	PAW08	082		struttura	MOQUETTE	foratura	mq	87,00				
L	PI 10	interno		083		struttura	foratura	mq	169,90					
L	PI 10	interno		084		struttura	foratura	mq	169,90					
L	PI 10	interno	PAW08	085		struttura	foratura	mq	149,90					
L	PI 10	interno	FIR03	086		struttura	foratura	mq	142,90					
L	PI 11	interno	PAW06	087		struttura	foratura	mq	59,90					
L	PI 11	interno	FIR03	088		struttura	foratura	mq	84,90					
L	PI 11	interno	PAW07	089		struttura	foratura	mq	47,90					
L	PI 11	interno	FIR03	090		struttura	foratura	mq	84,90					
L	PI 11	interno	PAW04	091		struttura	foratura	mq	159,90					
L	PI 11	interno	SCH01	092		struttura	foratura	mq	20,00					
L	PI 11	interno		093		struttura	foratura	mq	21,00					
L	PI 11	interno		094		struttura	foratura	mq	111,00					
L	PI 11	interno		095		struttura	foratura	mq	222,00					
L	PI 11	interno		096		struttura	foratura	mq	150,00					
L	PI 11	interno		097		struttura	foratura	mq	170,00					
L	PI 11	interno		098		struttura	foratura	mq	75,00					
L	PI 11	esterno		099		struttura	incollaggio	mq	38,00					
L	PI 11	esterno		100		struttura	incollaggio	a corpo	1,00					
L	PI 11	esterno		101		struttura	foratura	mq	38,00					
L	PI 11	esterno		102		struttura	foratura	mq	24,00					
M	PI 11	esterno		103		verete per mascheramento luci esterne	foratura	mq	120,00					
M	PI 11	esterno		104		verete per mascheramento luci esterne	foratura	mq	120,63					
M	PI 11	esterno		105		verete per mascheramento luci esterne	foratura	a corpo	1,00					
M	PI 11	esterno		106		verete per mascheramento luci esterne	foratura	a corpo	1,00					
M	PI 11	esterno		107		montaggio moquette	foratura	mq	1211,69					
M	PI 11	esterno		108		trasporto	foratura	a corpo	1,00					
M	PI 11	esterno		109		trasporto	foratura	a corpo	1,00					
M	PI 11	esterno		110		trasporto	foratura	a corpo	1,00					
M	PI 11	esterno		111		verete	foratura	a corpo	1,00					
M	PI 11	esterno		112		verete	foratura	a corpo	1,00					
M	PI 11	esterno		113		verete	manodopera	a corpo	1,00					
M	PI 11	esterno		114		verete	foratura	a corpo	1,00					
M	PI 11	esterno		115		verete	manodopera	a corpo	1,00					
M	PI 11	esterno		116		verete	foratura	a corpo	1,00					
M	PI 11	esterno		117		verete	foratura	a corpo	1,00					
M	PI 11	esterno		118		verete	foratura	a corpo	1,00					
M	PI 11	esterno		119		verete	foratura	a corpo	1,00					
M	PI 11	esterno		120		verete	foratura	a corpo	1,00					

site	anno	partenza	area	codice	prog.	settore/innovazione	descrizione	NOTE/IT'S	unità di misura	Quantità	altri dimensionati	prezzo unitario	totale	Subtotale	codice tavola di riferimento	tariffa
C	PT	16	esterno		001	Tram esterno	struttura		molleggio	a corpo		1,00				
C	PT	16	esterno		002	Tram esterno	rivestimento		formica	mq		44,40				
C	PT	16	esterno	MUR04	000	Parapente	armatura		molleggio	a corpo		1,00				
C	PT	16	esterno	MUR04	004	Parapente	rivestimento	ALLUMINIO	formica	mq		37,00				
C	PT	09	interno	SP002	005	Ingresso Acciaio	lavoro ancoraggio		formica	mq		6,00				
C	PT	10	interno		006	Capitolato	lavoro per anelli		formica	cad.		3,00				
C	PT	08	interno	AV001	007	Galleria Lounge	Bancane BANCA	Banca n°1 ha detto clienti la scorsa volta i tecnici non erano andati in gara	formica	a corpo		1,00				
C	PT	08	interno	FN004	008	Galleria Lounge	parete rivestimento strutture in acciaio/galleria	ALLUMINIO (A LAVORO INCLUSO ANELLI DI STABILITÀ)	formica	mq		15,00				
C	PT	08	interno	SCH02	009	Galleria Lounge	Struttura sostegno schermo led		formica	mq		14,00				
C	SI	01	interno	PAV01	010	Parapente	rivestimento	PATTERN STAMPATO	formica	mq		214,00				
C	SI	01	interno	FN001	011	Parapente	rivestimento pareti	BIANCO	formica	mq		84,00				
C	SI	01	interno	FN003	012	Parapente	rivestimento rete basso	NO	formica	mq		15,00				
C	SI	01	interno	FN002	013	Parapente	pannelli		formica	mq		69,00				
C	SI	01	interno		014	Parapente	pannelli		formica	a corpo		1,00				
C	SI	01	interno		015	Parapente	regolazione soffitti per mascheramento luci sospensione		formica	mq		218,00				
C	SI	02	interno	PAV07	016	Luce per illuminazione	rete illuminazione cucina		formica	mq		34,00				
C	SI	02	interno		017	Luce per illuminazione	impianto litico a tre luci stenze		formica	cad.		5,00				
C	SI	02	interno	PAV04	018	Luce per illuminazione	pedana solo vano marciapiedi		formica	mq		3,00				
C	SI	02	interno		019	Luce per illuminazione	regolazione mobile		formica	a corpo		1,00				
C	PT	13	esterno	SI001	020	Parapente	pedana		formica	mq		109,00				
C	PT	13	esterno	SI002	021	Parapente	struttura in elevazione (placati a trav)		formica	mq		267,00				
C	PT	13	esterno	SI003	022	Parapente	struttura in elevazione (placati)		formica	mq		204,00				
C	PT	13	esterno	SI004	023	Parapente	armatura di copertura		formica	mq		270,00				
C	PT	13	esterno	MUR01	024	Parapente	lavoro esterno all'interno con eda		formica	mq		242,00				
C	PT	13	esterno	FN009	025	Parapente	pannelli interni		formica	mq		330,00				
C	PT	13	esterno	PAV03	026	Parapente	pannelli		formica	mq		179,00				
C	PT	13	esterno	CON01	027	Parapente	soffitto		formica	cad.		6,00				
C	PT	13	esterno		028	Parapente	rivestimento plati		formica	mq		16,00				
C	PT	13	esterno	SCA01	029	Parapente	pedana con gradini di uscita		formica	mq		3,00				
C	PT	13	esterno	SCA02	030	Parapente	porta a vetri con maniglione antiparco		formica	cad.		1,00				
C	PT	13	esterno	FO002	031	Parapente	impianto di riscaldamento/raffrescamento		formica	a corpo		1,00				
C	PT	13	esterno	FO003	032	Parapente	Simone gpl, acciaio, vaspoio e rifinitaggio a Roma all'isola		formica	a corpo		1,00				
C	PT	13	esterno	PAV02	033	Parapente	regolazione stampanti e bordata	LEGNO	formica	mq		46,00				
C	PT	13	esterno	PAV08	034	Parapente	trave in tessuto	ALLUMINIO	formica	mq		31,00				
C	PT	13	esterno	SCA03	035	Parapente	pannelli di collegamento	ALLUMINIO	formica	mq		9,00				
C	PT	13	esterno	MUR02	036	Parapente	pannelli di collegamento pareti	ALLUMINIO	formica	mq		8,00				
C	PT	13	esterno	CON02	037	Parapente	pannelli di collegamento soffitti	ALLUMINIO	formica	mq		9,00				
C	PT	13	esterno	MUR05	038	Parapente	pareti schermate impianti esterni parigione	ALLUMINIO	formica	mq		8,00				
C	PT	13	esterno	EP001	039	Parapente	maniglia di metallo		formica	mq		13,00				
C	PT	17	esterno	FN006	038	Parapente	traverse di metallo	LEGNO	formica	mq		11,00				
C	PT	14	esterno		039	Parapente	struttura edicola		formica	a corpo		1,00				
C	PT	14	esterno	MUR01	040	Parapente	soffitto a appoggio di metallo anelli fissi	ALLUMINIO	formica	mq		39,75				
C	SI	07	interno		041	Chiuso	struttura in metallo a pannello e montaggio anelli		formica	a corpo		1,00				
C	SI	07	interno		042	Chiuso	pannelli occhio piano		formica	mq		12,00				
C	PT	-	esterno		043	Chiuso	divanta per mascheramento luci esterne		formica	nit.		129,00				
C	PT	-	esterno		044	Chiuso	può microforato per convertitori esterni		formica	mq		120,00				
C	-	-	-		045	Chiuso	giallo in acciaio		formica	a corpo		1,00				
C	-	-	-		046	Chiuso	montaggio moquette		manodopera	mq		260,00				
C	-	-	-		047	Chiuso	montaggio		manodopera	a corpo		1,00				
C	-	-	-		048	Chiuso	trasporto facchinaggio		formica	a corpo		4,00				
C	-	-	-		049	Chiuso	montaggio Arca		manodopera	a corpo		1,00				
C	-	-	-		050	Chiuso	Simontaggio / smontamento		manodopera	a corpo		1,00				
C	-	-	-		051	Chiuso	edili		molleggio	a corpo		1,00				
C	-	-	-		052	Chiuso	Formulare - vedi capitolo specifico		formica	a corpo		1,00				
C	-	-	-		053	Chiuso	manodopera - vedi capitolo specifico		manodopera	a corpo		1,00				
C	-	-	-		054	Chiuso	edili - vedi capitolo specifico		edili	a corpo		1,00				
C	-	-	-		055	Chiuso	facchinaggio - vedi capitolo specifico		manodopera	a corpo		1,00				

1.550.915,18 €

Quota IVA ann. 310.960,90 € residuo ammortamento

costo netto 2020 1.239.954,28 €
